

实验一：项目范围管理 2

一、 名词解释

1、范围蔓延：指项目范围在未受控制的情况下持续增加，通常由未走变更流程的额外需求引起。

二、 简答题

1、范围变更的流程

提出变更申请 → 评估变更影响 → 提交变更控制委员会审批 → 批准后更新范围基准 → 通知相关方并执行变更。

2、如何开展项目的范围核实？

依据范围基准和需求文件，对照可交付成果进行检查，邀请关键相关方参与确认，获得正式验收并形成核实记录。

三、 讨论题

1、分析 ChatGPT 给教育带来的影响

主要从学生方面来看，ChatGPT 提升个性化学习与答疑效率。ChatGPT 作为大模型可以回答高度个性化的问题，学生或老师聊一个对话窗口就好似在实现一对一的交流和指导。

弊端是，ChatGPT 可能导致学术不端、削弱批判性思维，倒逼教育评估方式改革。现在学业评估工作中会有 AI 查重环节。

从老师角度来看，ChatGPT 可以辅助一些重复的教学工作，一定程度上分担老师的工作压力，比如说读学生的论文初稿等。

2、分析 ChatGPT 对数媒产业的影响

ChatGPT 可辅助内容生成、创意设计和后期制作，提高数媒产业内容的生产效率。

传统人工岗位受到一定的冲击，他们面临提升人机协作与创意策划能力的挑战，即为了提高自己的工作效率和竞争力去学会使用 ChatGPT 这类新兴工具。

实验二：项目时间管理

一、名词解释

- 1、关键路径是项目网络图中耗时最长的路径，决定项目最短工期。
- 2、里程碑是工期为零、不消耗资源的逻辑联系任务，用于表达依赖关系。
- 3、虚任务是工期为零、不消耗资源的逻辑联系任务，用于表达依赖关系。
- 4、工作量是完成工作所需的人工或工时总量，工期是完成工作所需的日历时间，两者通过资源投入量关联。


四、简答题

- 1、如何看待任务的完成时间与资源是有密切关系的？
在固定工作量下，增加资源可缩短工期，但受资源协调、学习曲线等限制，并非线性关系。
- 2、若工期延误时，项目经理应该采取哪些措施对进度实施控制？
分析关键路径，采取赶工或快速跟进，增加资源或优化流程，与相关方沟通调整优先级，必要时压缩非关键路径。
- 3、项目管理中，项目经理应如何对进度和质量进行协调？
通过合理规划资源、设定质量标准、加强过程检查，在进度与质量冲突时优先保证质量，避免返工导致更严重延误。
- 4、在项目任务调整时，如何充分利用关键路径技术？

优先调整关键路径上的任务，压缩其工期以追赶进度；对非关键路径利用时差调配资源，避免其变为新关键路径。

三、计算题

【问题 1】

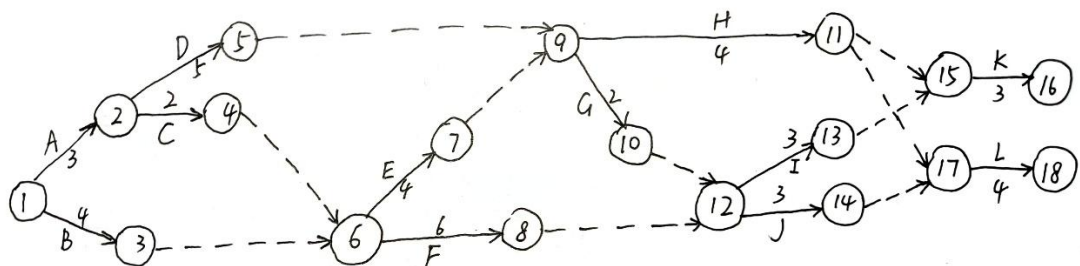

【问题 2】

关键路径有 2 条：

A → C → E → G → J → L

A → C → F → J → L

【问题 3】

- (1) 18 天。
- (2) 影响：项目工期将延长至 27 天，即延迟 9 天。
- (3) 处理方法：
 1. 对 B 活动采取赶工（增加资源或加班）压缩时间。
 2. 调整后续活动逻辑（如快速跟进，将部分并行改为重叠）。
 3. 若无法挽回，及时与客户沟通申请延期或调整范围。

实验三：完成案例分析报告

案例一：项目经理的困扰

1. 小李需要承担部分责任。作为项目经理，他未能主动协调职能部门、争取管理层支持，也未及时识别和纠正程序开发风险，但在资源调度和预算上受制于公司规定，责任不完全在他。

2.

- 1) 缺乏实际职权，受限于不得干涉部门经理的调度和预算。
- 2) 沟通与向上管理不足，前期未及时暴露问题。
- 3) 盲目投入 12 人开发无用程序，未做可行性评估。
- 4) 与客户代表关系恶化，未能有效管理干系人。
- 5) 项目滞后严重且无成型成果，失去公司管理层的信任。

3.

- 1) 明确项目范围和关键里程碑，分解工作包。
- 2) 与职能经理协商资源承诺，签订内部协议。
- 3) 采用滚动式规划，近期详细、远期粗略。
- 4) 建立风险应对计划。
- 5) 设定阶段性评审点，及时向管理层汇报偏差。

案例二：

1. 苏的问题：

- 1) 过度依赖项目管理软件，未核实实际进度，程序员虚报。
- 2) 缺乏对客户方人员变更的管理，注册主任授权给不懂流程的文员。
- 3) 未识别关键需求变更，学期制转半学期制，仍用旧数据。
- 4) 自负、不愿向上级或客户承认问题。
- 5) 沟通不足，尤其与客户干系人面对面交流少。

原因：缺乏有效监控、干系人管理、需求验证和坦诚沟通。

2. 解决问题：

- 1) 立即召集核心团队和客户代表，重新评估剩余工作，压缩关键路径。
- 2) 与客户明确结束指令的授权人和评审时间，固定会议周期。
- 3) 补上需求确认环节，联合测试真实数据。
- 4) 建立每周实际成果演示，不再依赖软件状态报告。
- 5) 向上级如实汇报风险，争取资源或调整范围。

避免措施：采用里程碑趋势图跟踪进度；定期进行质量审计；强制要求客户关键干系人参与评审。

3. 用户参与的重要性：

- 1) 确保需求准确完整，避免遗漏重大变更。
- 2) 及时提供结束指令，减少等待和返工。
- 3) 帮助识别隐含问题，提高验收通过率。
- 4) 增强用户责任感，减少对抗，促进项目顺利交付。
