

实验一：项目范围管理 2

一、名词解释

1、范围蔓延

范围蔓延是指项目范围在未受控的情况下逐渐扩大的现象。这通常表现为在项目启动后，不断有新的需求、功能或工作被悄悄地添加进来，导致项目超出最初定义的界限、预算和时间计划。

二、简答题

1、范围变更的流程

范围变更的流程是一个结构化的过程，旨在确保项目范围的任何调整都经过正式控制。它通常包括识别和提交变更请求、评估变更对项目各项约束的影响、由授权方（如变更控制委员会）审批或拒绝变更、然后根据决策更新所有受影响的项目文件，并向干系人进行沟通，最后实施已批准的变更。

2、如何开展项目的范围核实？

项目的范围核实是获得客户或发起人正式验收已完成项目可交付成果的过程，以确保它们符合项目范围说明书和质量要求。这通常通过与客户共同审查可交付成果、核对工作分解结构（WBS）中所有工作包的完成情况，并获取正式签字或批准来完成，旨在确保所有相关方都同意已交付的成果满足既定需求。

三、讨论题

1、分析 ChatGPT 给教育带来的影响

ChatGPT 对教育领域带来了深远影响，它既是强大的学习辅助工具，能够提供个性化学习体验、辅助教师备课、加速学生获取知识和进行语言学习，从而提高学习效率；同时也带来了诸多挑战，例如可能引发学生抄袭作弊、削弱批判性思维能力、信息准确性存疑以及加剧数字鸿沟，因此需要教育者积极调整教学方法，引导学生与 AI 协作而非过度依赖，以发挥其最大潜力并规避潜在风险。

2、分析 ChatGPT 对数媒产业的影响

ChatGPT 对数媒产业产生了变革性影响，它极大地提高了内容创作的效率，可以辅助生成新闻稿、营销文案、脚本等，并能实现个性化内容推荐和多语言本地化，同时也能辅助设计开

发和优化营销传播策略。然而，这也带来了内容同质化、版权伦理争议、就业结构变化以及可能导致信息茧房等挑战，要求数媒从业者和产业生态必须适应这种变化，注重人机协作，以保持创新力和独特性。

实验二：项目时间管理

一、名词解释

1、关键路径

关键路径是指在项目网络图中，从项目开始到结束所有路径中最长的一条路径，它决定了项目的最短完成时间。关键路径上的任何任务延迟都会直接导致整个项目工期的延迟，因此，对关键路径的有效管理是确保项目按时完成的关键。

2、里程碑

里程碑是项目生命周期中具有重要意义的时间点或事件，通常代表着一个主要阶段的完成、一个重要可交付成果的完成、或一个关键决策点的到来。里程碑本身没有持续时间，它们主要用于监控项目进度、激励团队、向干系人报告项目状态，并作为项目控制和沟通的参考点。

3、虚任务

在项目网络图中，虚任务是一种不消耗时间、不占用资源的逻辑关系表示。它通常用于表达两个或多个任务之间的依赖关系，尤其是在某些情况下，需要确保特定的逻辑顺序，但实际上并没有一个真实的“任务”来连接它们，主要作用是维护网络图的正确逻辑连接性。

4、工作量和工期

工作量是指完成一个任务所需的人力投入总量，通常以人天、人月等单位衡量，反映的是“做多少事”。而工期是指完成一个任务所需的时间跨度，通常以天、周、月等单位衡量，反映的是“多长时间能做完”。工作量和工期密切相关但并非等同，工作量可以通过增加资源来缩短工期，但在特定任务中两者关系并非简单的线性对应。

四、简答题

1、如何看待任务的完成时间与资源是有密切关系的？

任务的完成时间与资源之间存在密切关系，通常表现为在一定限度内，增加资源投入（如增加人力、设备或更高效的工具）可以在不改变任务本身工作量的前提下有效缩短任务的工期，这被称为“赶工”。然而，这种关系并非无限线性，过度增加资源可能导致效率下降、沟通成本增加，甚至影响质量，因此项目经理需要在资源投入和工期缩短之间找到最佳平衡点，实现效益最大化。

2、若工期延误时，项目经理应该采取哪些措施对进度实施控制？

当项目工期出现延误时，项目经理应立即采取一系列措施进行进度控制，包括分析延误原因并评估其影响、与团队成员沟通寻求解决方案、考虑采用赶工（如增加资源、加班）或快速跟进（并行开展通常顺序进行的活动）等策略来压缩工期。此外，还需要及时更新项目计划、重新评估风险、与干系人沟通进度变化，并严格监控后续任务的执行情况以避免进一步延误。

3、项目管理中，项目经理应如何对进度和质量进行协调？

项目经理应在项目规划阶段就设定清晰可衡量的进度目标和质量标准，并在执行过程中持续监控。在面临进度压力时，不应盲目牺牲质量来赶工，而应通过优化流程、有效分配资源、识别关键路径并进行风险管理等方式来平衡两者，确保项目在合理工期内交付满足或超越质量要求的产品或服务。

4、在项目任务调整时，如何充分利用关键路径技术？

项目经理应首先识别出当前的关键路径及其上的任务。任何需要缩短项目总工期的调整，都必须针对关键路径上的任务进行，例如通过“赶工”或“快速跟进”来压缩这些任务的工期。同时，调整非关键路径任务时，应确保其浮动时间（机动时间）不被耗尽以至于变成新的关键路径，从而避免意外导致项目总工期延长。通过持续监控和更新关键路径，项目经理可以在任务调整中做出明智决策，有效控制项目进度。

三、计算题

希赛信息技术有限公司(CSAI)是一家从事制造行业信息系统集成的公司，最近，公司承接一家企业的信息系统集成的业务。经过公司董事会的讨论，决定任

命你作为新的系统集成项目的项目经理，在你接到任命后，开始制订进度表，这样项目才可以依照进度表继续下去。


在与项目团队成员探讨后，假设已经确认了 12 项基本活动。所有这些活动的名称、完成每项活动所需的时间，以及与其他活动之间的约束关系如表 3-8 所示。

表 3-8 工作分解结构

活动名称	必需的时间（天）	前置任务
A	3	
B	4	
C	2	A
D	5	A
E	4	B, C
F	6	B, C
G	2	D, E
H	4	D, E
I	3	G, F
J	3	G, F
K	3	H, I
L	4	H, J

【问题 1】

为了便于对项目进度进行分析，可以采用箭线图法来描述项目进度，请画出项目进度计划中箭线图。

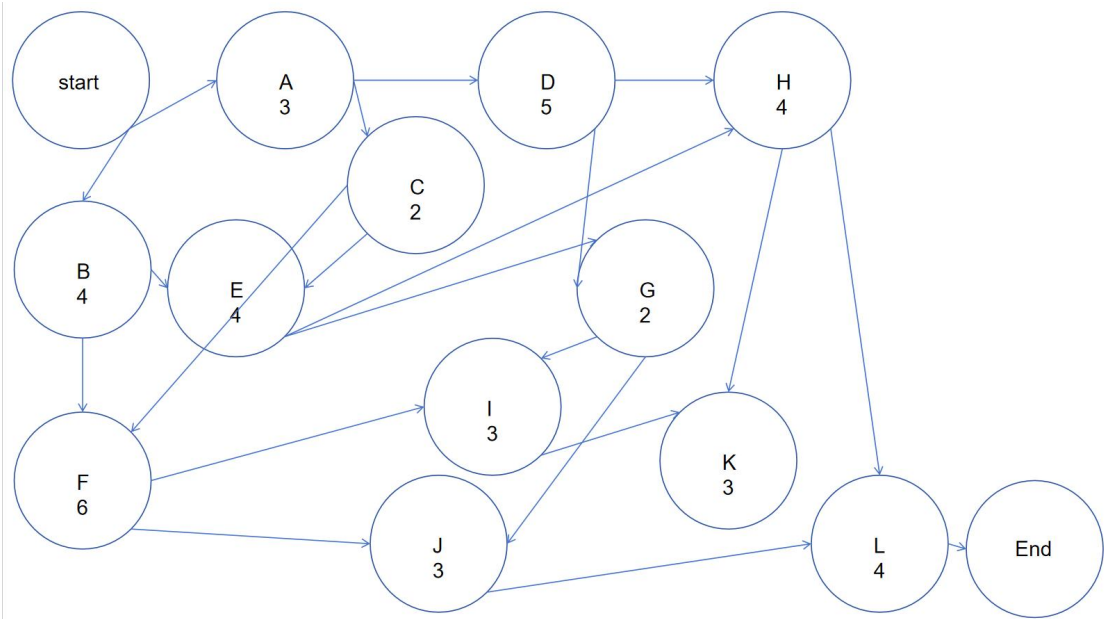

【问题 2】

本题中的关键路径有几条，并给出关键路径？

1 条。

关键路径是：A -> C -> F -> J -> L

【问题 3】

你要花多长时间来计划这项工作？如果在任务 B 上迟滞了 10 天，对项目进度有何影响？作为项目经理，你将如何处理这个问题？

根据计算，规划这项工作（即项目的最短完成时间）需要 18 天。如果在任务 B 上迟滞了 10 天，由于任务 B 所在路径的浮动时间只有 1 天，这将导致项目总工期从 18 天延长 9 天，使项目在 27 天完成，并且原非关键路径（涉及 B 的路径）将变为新的关键路径。作为项目经理，我将立即分析延误原因，并评估对后续任务和总工期的具体影响；然后，我会着重对新的关键路径上的任务（如 F、E、G、J、L）采取赶工或快速跟进策略，以压缩工期；同时，重新评估资源配置，可能从非关键任务中调配资源；如果仍无法弥补延误，将及时与客户沟通，提出正式的变更请求并协商解决方案，并加强后续进度监控和风险管理。

实验三：完成案例分析报告

1、 案例一：项目经理的困扰

小李是某公司的项目经理，在项目 A 筹备阶段就作为项目经理助理参与该项目，项目正式实施后被公司任命为项目经理。但使小李感到恼火的是：其他职能部门的经理虽然为该项目安排了时间和人手，但他们更热衷于其他项目。同时小李还被告之不要干涉部门经理对资源的调度和费用的预算，半年之后，小李借向公司管理层汇报项目进度的机会向管理层说明了由于职能经理不合作而造成的项目严重拖期情况，这次汇报引起了公司管理层的注意，他们投入了更多的资源来使项目回到正常轨道上来，小李不得不花费很多时间来准备文案、报告和投影以及各种各样的会议。公司管理层还为小李制定了一个项目经理助理，该主力认为应该通过计算机程序把各种问题程序化，于是公司又投入了 12 个人来开发这个程序，在花费了巨额资金之后，小李发现这个程序并不能实现其目标，他向一个软件供应商进行了咨询，得知若要完成该程序，还需要花费数倍的资金和两个月的时间，无奈之下，小李只好放弃了该程序。

这个时候项目的情况已经很困难了，项目滞后了 9 个月，但还没有成型的单元完成，客户对项目拖期问题非常关注，小李不得不花大量时间向客户解释存在的问题和补救计划。三个月之后，项目仍然没有大的进展，客户开始不耐烦了，尽管小李进行了大量的解释和说明，但客户仍然不能接受严重拖期，于是指派了一个代表到项目现场监督工作。客户代表要求找出问题并持续更新，继而试图参与进来解决问题，小李和客户代表在一些问题上产生了激烈的冲突，导致两人关系恶化。

公司管理层最后撤换了小李，项目 A 在超期一年之后，以预计费用的 140%最终完成。小李在项目 A 中遇到了很多项目经理都曾经遇到的困难。

请回答：

1、 小李应该为此项目产生的问题负责吗？并分析。

小李应承担部分责任，因为他未能早期有效沟通争取权责，对职能经理不合作和资源调度受限问题处理不当，也未能有效引导管理层介入后的资源使用，导致在项目计划和风险管理上失职。然而，公司在权力分配、组织支持和错误决策（如失败的程序开发）上也存在问题，项目失败是多方因素共同作用的结果。

2、 试分析小李被撤换及失败的原因有哪些？

小李被撤换和项目失败的主要原因包括：作为项目经理权责不对等，无法有效控制资源；沟

通管理不力，与管理层和客户沟通滞后且无效，甚至与客户代表关系恶化；风险管理不足，未能识别和应对组织冲突、资源浪费等风险；进度和质量失控，项目严重滞后且缺乏实际进展；以及领导力与决策力欠缺，未能有效整合资源、解决问题。

3、如果你是小李，面对这样的问题你应该怎么制定切实可行的项目计划？

如果我是小李，我会优先明确并争取项目经理的权责，确保对资源和预算的控制力，并在计划中加入清晰的沟通管理策略，定期向所有干系人透明汇报并寻求支持。我还会制定全面的风险管理计划，预判并应对组织协作、资源限制等风险，并采用迭代或阶段性交付的方式，设定清晰里程碑，确保每个阶段有可验证成果，以便及时调整和纠正偏差。

2、案例二：如何管控好项目的进度【图文并茂】

苏.约翰逊是一家咨询公司的项目经理，该公司已签定合同，向一所当地大学提供一个新的在线注册系统。该套系统必须在五一前能够运行，这样学生就能够用它在秋季这个学期进行注册。如果到那时系统还不能运行，她的公司要受到严厉的合同惩罚条款的制裁；如果工作完成得漂亮，苏和她的团队就会得到一笔丰厚的奖金。苏知道，达到进度要求的控制范围、成本和质量是她的责任。她和她的团队制定了一套详细的进度计划和网络图，以帮助组织项目。

制定进度计划容易，使项目沿着既定的轨道前进则要困难得多。管理人的问题以及解决进度计划的冲突，是两个最大的挑战。该客户的许多雇员临时休假，因此错过了一些项目评审会议，或者重新改变设定了一些项目评审会议的时间。因为苏的团队在系统开发生命周期的各阶段，都需要有来自客户的结束指令，所以上述变更使苏和她的团队难以按原来计划的进度进行。苏的团队中一位高级程序员退出了，她知道要想找到一个新人来跟得上大家的速度，又将占用额外的时间。现在仍处在项目的早期，不过苏知道他们正在落后。她该做些什么才能赶得上五一的系统运转日期呢？

现在是3月15日，再过一个半月新的在线注册系统就要启用了。项目目前是一片混乱。苏.约翰认为她能处理好所有在项目进行过程中出现的冲突，并且她很自负，不向其上司或大学校长承认事情进展得不顺利。她花了大量的时间来详细准备项目的进度计划，并且她认为自己的项目管理软件使用得很好，可以跟上项目的状态。事实上，项目中有5位主要的程序员都清楚一种方法，使自己的任务在软件上每周自动更新，并说一切按预定计划进行。他

们很少注意实际的计划，而且憎恨填写状态信息。苏并没有核实他们所做的大部分工作，以检查它们是不是真正的完成了。另外，注册办公室主任对项目不感兴趣，而且将结束指令责任授权给他的一个文员，而该文员对整个注册过程并不理解。

当苏和她的团队开始测试新系统时，她才发现她的队员们使用的是去年的课程数据。由于大学在秋季将从过去的学期制转向半学期制，因此使用去年的课程数据会导致一些额外的问题。他们怎么能把这个要求漏掉呢？

苏为了寻求帮助而和她的经理一起步入会议厅时，她害羞地低垂着脑袋。她通过惨痛的教训知道了保持进度进行是多么的困难。为了核实关键可交付成果是否已满足了客户的需求，苏真希望她能多花一些时间与关键的项目干系人进行面对面的沟通，尤其是她这边的程序员与校方注册办公室的代表之间的沟通。

参考讨论题：

1. 苏.约翰逊在项目管理过程中存在哪些问题？产生问题的原因？

苏.约翰逊存在沟通管理、进度控制、质量管理和干系人管理等多方面问题：她未能有效与客户沟通需求和指令，过于依赖软件自动更新而缺乏实际核实，导致进度虚报；疏忽了关键输入数据核查，导致质量问题；也未能有效争取客户关键人员的参与。这些问题源于她的经验不足、过度自信、沟通技巧欠缺以及未能充分运用和落实项目管理知识。

2. 你若作为项目经理，你计划如何解决问题？并如何避免类似问题的出现？

如果我是苏，我将立即向上级和客户坦诚汇报，请求支持并共同制定补救计划。我会召集团队和关键客户代表，重新核实实际进度、纠正虚报、澄清需求，并调整计划。同时，加强面对面沟通与核实机制，确保需求准确性和进度真实性。为避免再犯，我将建立健全的沟通和风险管理计划，强化干系人参与，并加强对团队的监督与支持，确保进度和质量的持续、真实控制。

3. 结合案例中，请分析用户参与对于项目的重要性？

结合案例，用户参与对项目至关重要：它能确保需求准确性，避免像课程数据错误这类因缺乏用户专业输入导致的关键缺陷；加速决策流程，及时获取“结束指令”，避免项目因等待客户确认而延误；建立信任并减少冲突，通过频繁互动解决问题，而非临近交付才发现巨大偏差；最终，用户深度参与能提高系统的采纳度和满意度，确保交付的系统真正符合其业务需求和预期。

