

编制时间计划


根据上次实验课确定的项目任务分解

1、请确定项目的开始时间和结束时间

开始时间：4月18日；结束时间：5月14日。

2、估计每个任务完成时间（列表），使用AOE网络给出活动之间的逻辑关系（画图）

任务编号	A	B	C	D	E	F	G	H	I
任务名称	需求分析	系统总体设计	屏幕识别模块开发	文本转语音模块开发	大模型接入与训练	前端界面开发	系统集成	测试与优化	项目总结与报告
负责人	全体	马鑫	杨子祺、王婧晋	马鑫	梁艺馨	刘宇轩	全体	全体	全体
工期(天)	3	3	8	8	7	7	5	4	3
前置任务		A	B	B	B	B	C、D、E、F	G	H

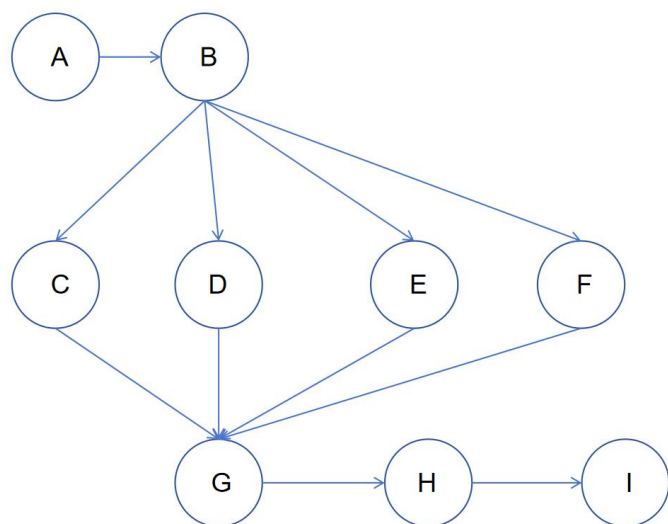

3、计算项目的关键路径

路径 1:

$$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow G \rightarrow H \rightarrow I$$

$$= 3 + 3 + 8 + 5 + 4 + 3 = 26 \text{ 天}$$

路径 2:

$$A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow G \rightarrow H \rightarrow I$$

$$= 3 + 3 + 8 + 5 + 4 + 3 = 26 \text{ 天}$$

路径 3:

$$A \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow G \rightarrow H \rightarrow I$$

$$= 3 + 3 + 7 + 5 + 4 + 3 = 25 \text{ 天}$$

路径 4:

$$A \rightarrow B \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow H \rightarrow I$$

$$= 3 + 3 + 7 + 5 + 4 + 3 = 25 \text{ 天}$$

关键路径:

$$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow G \rightarrow H \rightarrow I$$

$$A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow G \rightarrow H \rightarrow I$$

关键路径长度: 26 天

4、使用 Project 生成甘特图



5、请用表格形式给出项目的里程碑

里程碑编号	里程碑名称	说明	时间节点
M1	项目启动	项目正式启动	4.18
M2	需求分析与调研完成	明确用户需求与技术路径	4.24
M3	屏幕识别	屏幕识别模块开发完成	5.2
M4	语音生成	文本转语音模块开发完成	5.2
M5	大模型接入	大模型模块开发完成	5.2
M6	前端界面	前端界面模块开发完成	5.2
M7	系统集成	所有功能成功集成	5.7
M8	测试优化	测试与优化完成	5.10
M9	项目结题	完成项目报告与使用说明等文档	5.13


6、识别本项目可能出现导致项目拖延的原因（列表）， 并采用鱼骨图的形式描述出来

人员因素：项目成员技术不熟练、任务衔接延迟、协作沟通低效
技术因素：OCR 识别准确率不达标、TTS 模型集成报错、大模型接入兼容问题
资源因素：本地设备算力不足、模型下载和部署耗时、API 调用额度不足
需求因素：需求临时变更、功能范围扩大、用户反馈调整需求

管理因素：任务进度监控不及时、关键任务延误未补救、分工不合理

环境因素：电脑系统故障、网络中断、开发工具报错

集成因素：多模块联调箭筒问题、系统整合 bug 过多

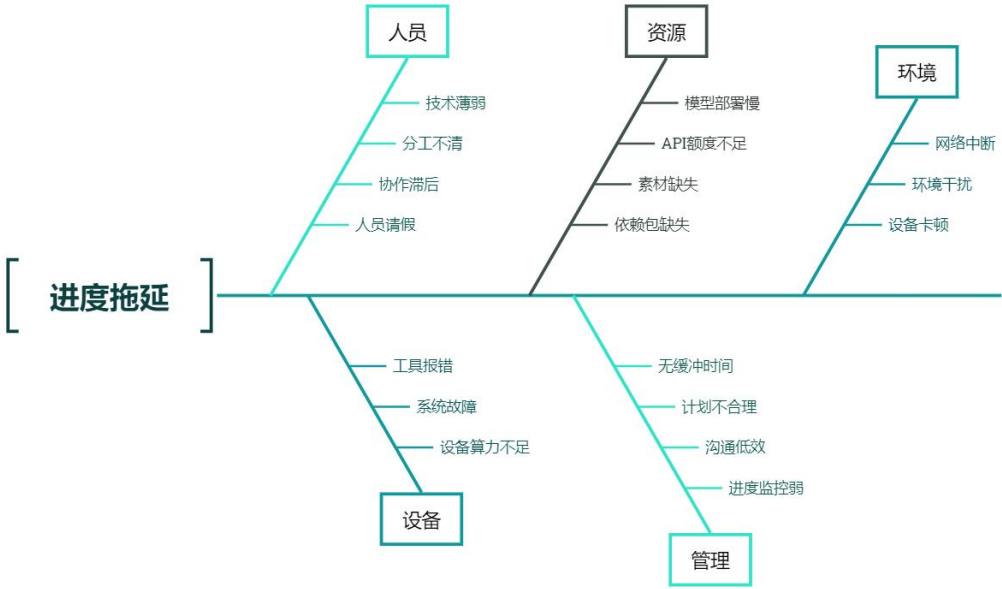

Presented with xmind
